Starosta Jaworski
ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor
tel. +48 76 729 01 00, fax. 48 76 729 01 60
www.jaworskie.pl
powiat-jaworski@powiat-jaworski.pl

Jawor, dnia 30 lipca 2026 r.

KD.7120.162.2.2026

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonej kontroli wykonania zadań technicznych
wynikających z realizacji projektu

W dniu 30.07.2026 r. na podstawie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) przeprowadzona została kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu dla zadana pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107388D relacji Wądroże Małe – Pawłowice Wielkie".

Data zawiadomienia: 07.07.2026 r.
Data wprowadzenia organizacji ruchu: 16.07.2026 r.
Data kontroli: 30.07.2026 r.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację fotograficzną załączoną do akt sprawy.

1. Wyniki kontroli
   W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:
   - brak zestawu znaków A-4 z B-33 (70km/h) w km 0+512 od strony Wądroża Małego,
   - znaki E-18a „Wądroże Małe" z D-43 powinny być umieszczone po drugiej stronie drogi,
   - usunąć tabliczkę „wyjazd 10m" pod znakiem A-7,
   - brak linii P-13 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2185D.

2. Zalecenia pokontrolne:
   Należy usunąć niezgodności wskazane w pkt 1 protokołu kontroli i doprowadzić organizację ruchu w terenie do stanu zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
   Organ zarządzający ruchem na drodze na podstawie § 12 ust. 6 pkt 3 ww. rozporządzenia wyznacza termin 60 dni na doprowadzenie organizacji ruchu do stanu zgodnego z zatwierdzoną organizacją ruchu.
   Organ zarządzający ruchem zobowiązuje jednostkę wprowadzającą organizacje ruchu do przekazania informacji o podjętych działaniach, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą wprowadzone zmiany.

Osoba przeprowadzająca kontrolę: *Katarzyna Kasprzyk.*

Sprawę prowadzi: Katarzyna Kasprzyk, k.kasprzyk@powiat-jawor.pl, tel. 076 72 90 103

Starosta Jaworski
ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor
tel. +48 76 729 01 00, fax. 48 76 729 01 60
www.jaworskie.pl
powiat-jaworski@powiat-jaworski.pl

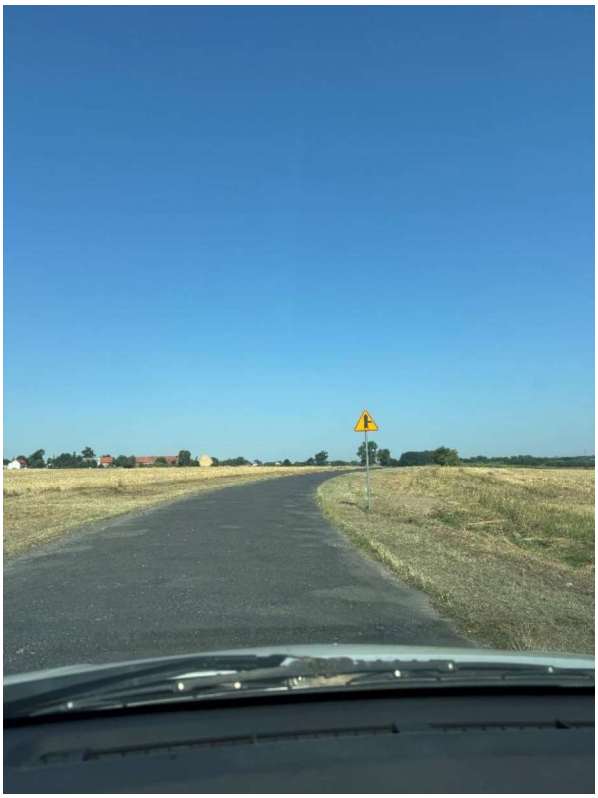

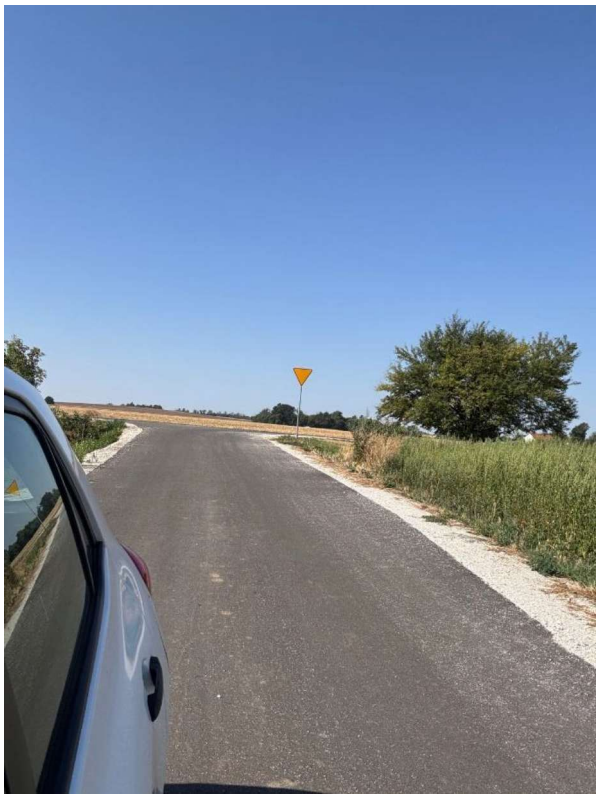





Sprawę prowadzi: Katarzyna Kasprzyk, k.kasprzyk@powiat-jawor.pl, tel. 076 72 90 103

Starosta Jaworski
ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor
tel. +48 76 729 01 00, fax. 48 76 729 01 60
www.jaworskie.pl
powiat-jaworski@powiat-jaworski.pl





brak zestawu znaków A-4 z B-33 (70km/h)
w km 0+512 od strony Wądroża Małego





znaki E-18a „Wądroże Małe” z D-43 powinny
być umieszczone po drugiej stronie drogi

Sprawę prowadzi: Katarzyna Kasprzyk, k.kasprzyk@powiat-jawor.pl, tel. 076 72 90 103

Starosta Jaworski
ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor
tel. +48 76 729 01 00, fax. 48 76 729 01 60
www.jaworskie.pl
powiat-jaworski@powiat-jaworski.pl



usunąć tabliczkę „wyjazd 10m” pod znakiem A-7



brak linii P-13 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2185D

Sprawę prowadzi: Katarzyna Kasprzyk, k.kasprzyk@powiat-jawor.pl, tel. 076 72 90 103
